



COMUNE DI SEREGNO

Monza e Brianza



Via G. Gozzano n. 6
20831 Seregno (MB)
Tel. 0362.221543
0362.246248
Fax 0362.247012
e-mail: tre.emme.project@gmail.com

COMMESSA C52-21 Seregno - Demolizione ex Clinica Santa Maria	F.TO A4	ELABORATO DOC.PE07
FILE DOC.PE07	SCALA -	

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

DENOMINAZIONE PROGETTO

**OPERE PER LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE EX
CLINICA SANTA MARIA**

DENOMINAZIONE ELABORATO



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA	STESURA	VERIFICATO	APPROVATO
Settembre 2021	A.A.	L. MAGNAGHI	A. MAURI

I PROGETTISTI



REV	DATA	DESCRIZIONE
0	Settembre 2021	EMISSIONE

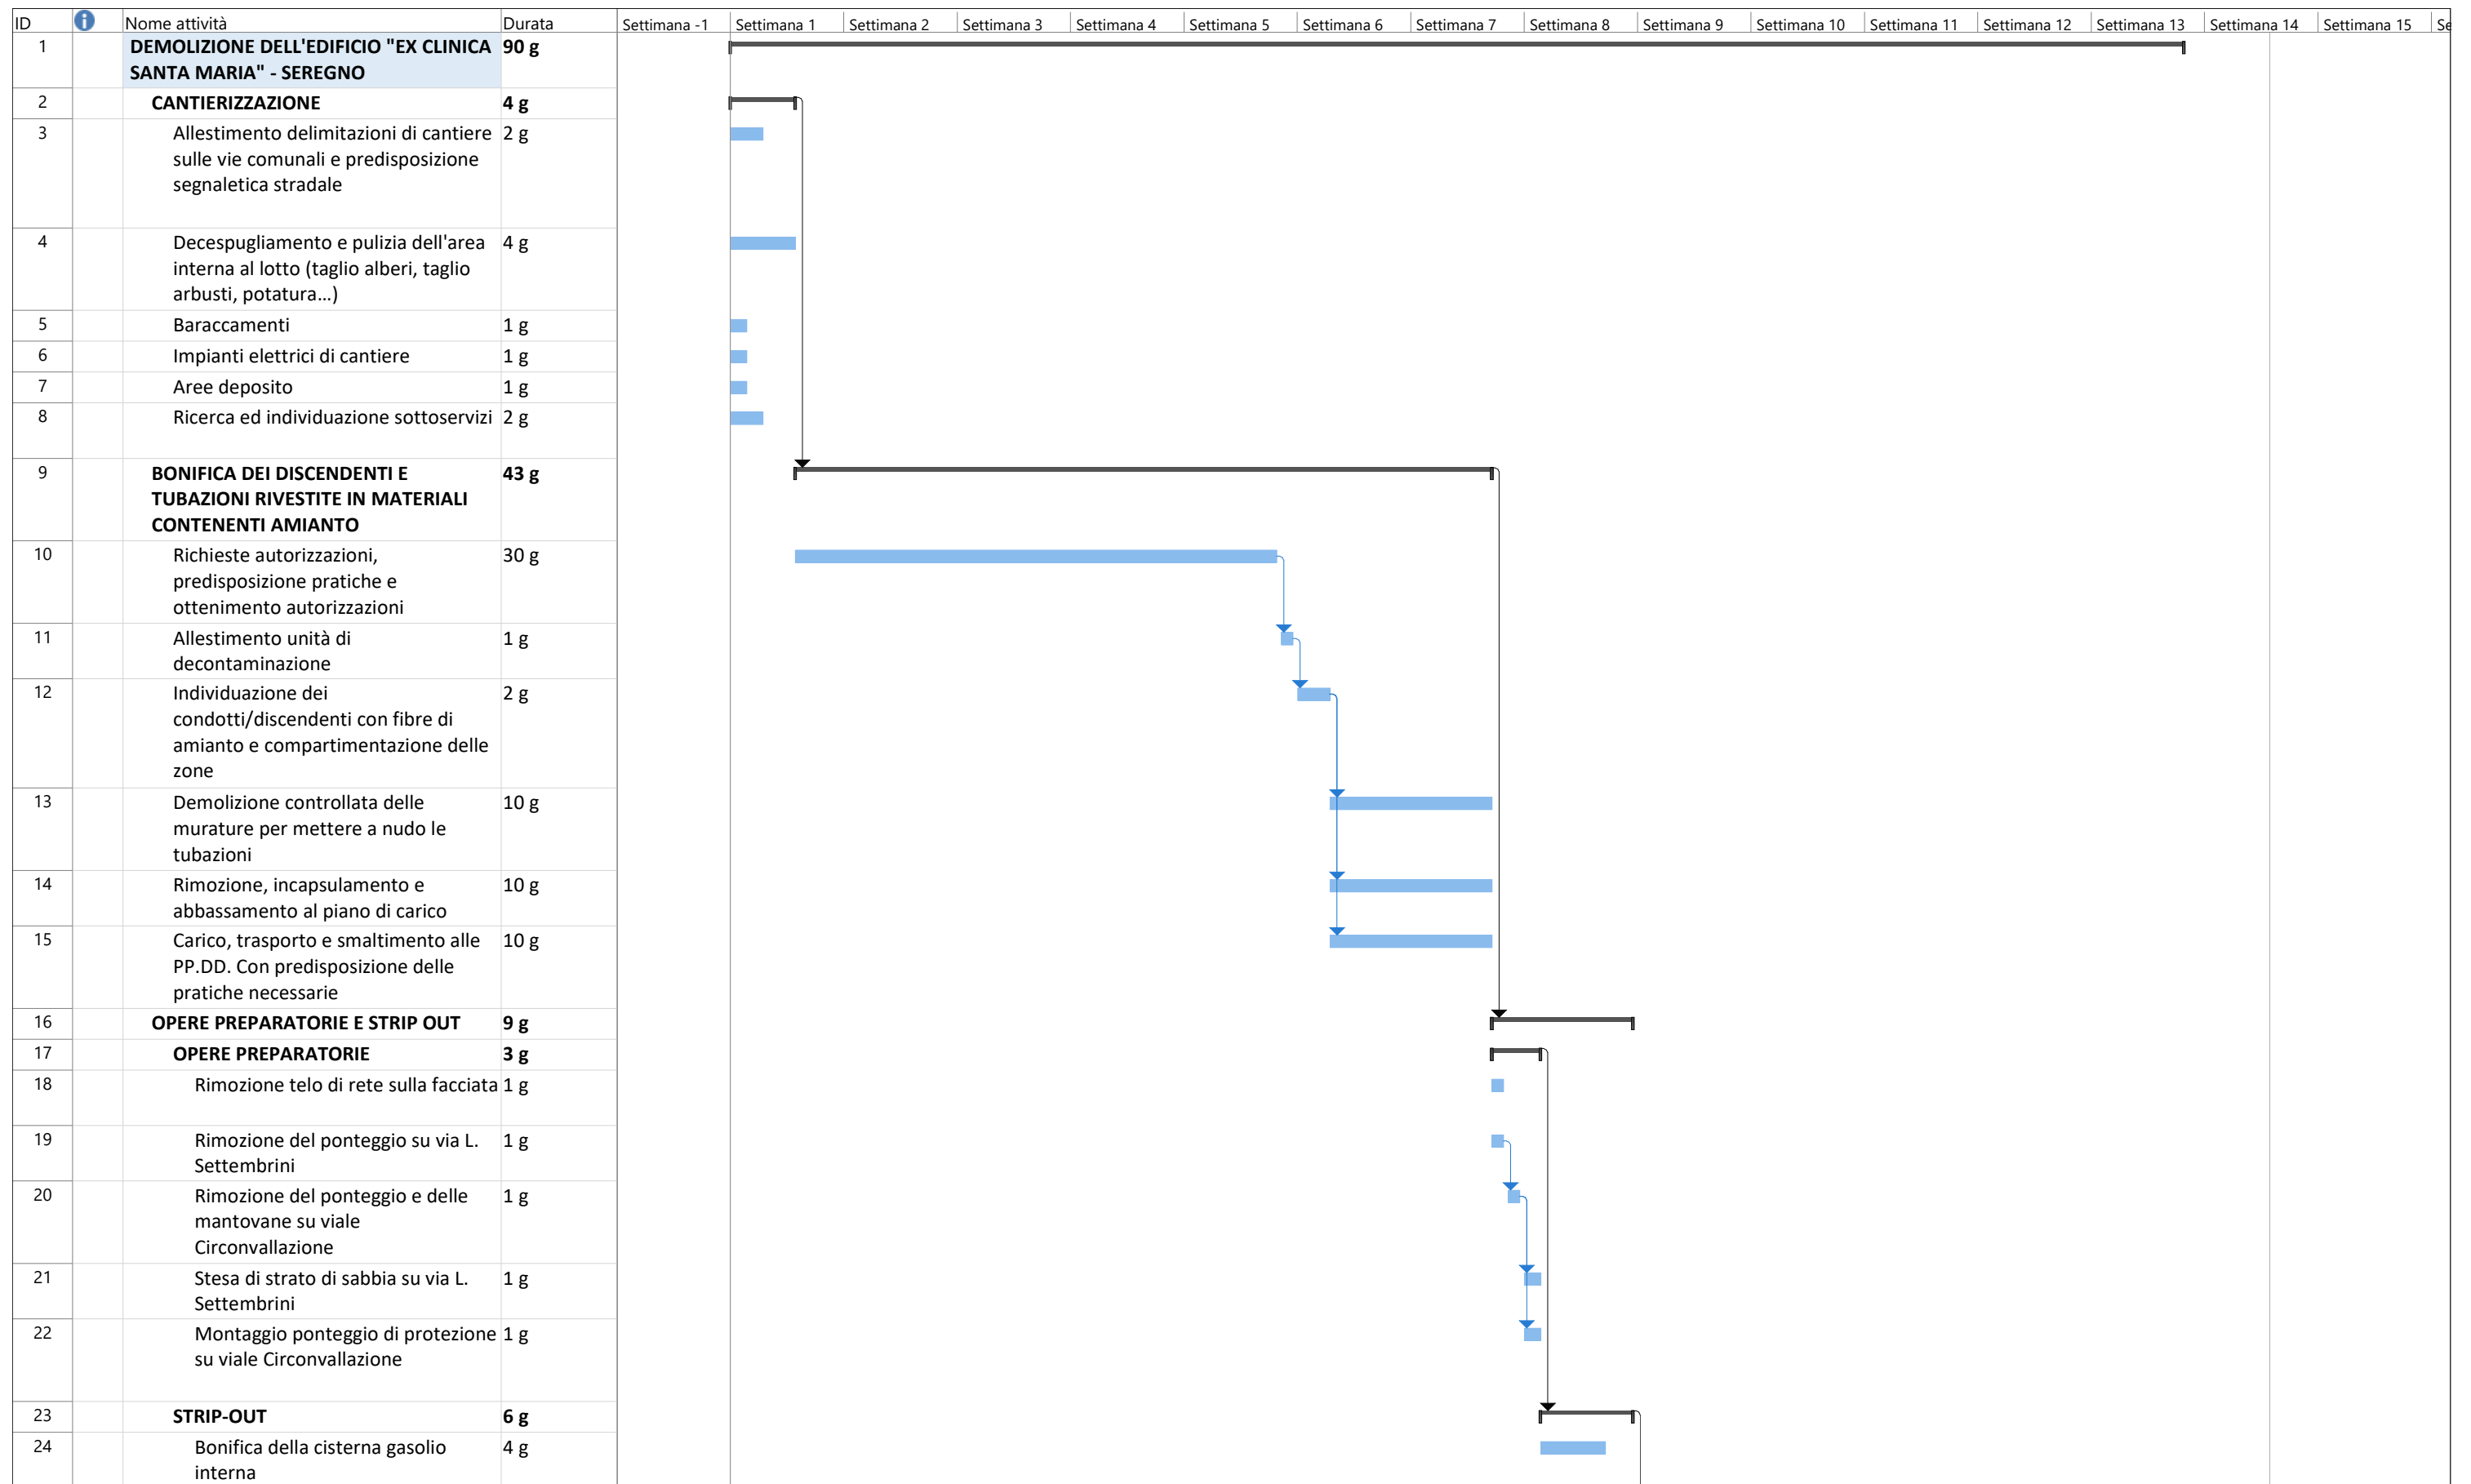

ID	Nome attività	Durata	Settimana -1	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Se
25	Rimozione delle lattonerie e della copertura in pannelli coibentati	6 g																	
26	Rimozione dei serramenti in legno e in ferro	6 g																	
27	Rimozione dei parapetti in acciaio	6 g																	
28	Rimozione delle vasche da bagno in acciaio	6 g																	
29	Rimozione dei rifiuti ingombranti (cucine, lettini, armadi metallici,...)	6 g																	
30	Rimozione degli impianti ascensori e montacarichi	6 g																	
31	Rimozione dei caloriferi	6 g																	
32	Rimozione delle tubazioni in acciaio	6 g																	
33	Rimozione delle scale e pianerottoli in legno	6 g																	
34	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI PORZIONE A CONFINE	14 g																	
35	Montaggio del ponteggio a sbalzo su proprietà attigua	3 g																	
36	Rimozione della lattoneria e di parte della copertura	1 g																	
37	Taglio a disco della muratura	10 g																	
38	Demolizione del muro di confine a mano o con piccoli attrezzi	10 g																	
39	DEMOLIZIONE TOTALE DEGLI EDIFICI	25 g																	
40	Demolizione dell'edificio con pinze	25 g																	
41	SOLUZIONI PROGETTUALI POST DEMOLIZIONE	6 g																	
42	Demolizione delle rampe scale di accesso all'interrato per scolo acque	1 g																	
43	Posa di rivestimento in pannelli del muro edificio rimasto	6 g																	
44	CAPPOTTO e sistemazione facciate	6 g																	
45	Sistemazione del cancello ingresso	2 g																	
46	RIMOZIONE AREE DI CANTIERE	5 g																	
47	Rimozione delle delimitazioni e dello strato di sabbia	2 g																	
48	Rimozione dei ponteggi	2 g																	
49	Rimozione del campo base di cantiere	2 g																	
50	Rifacimento della segnaletica	1 g																	
51	Pulizie delle aree	1 g																	

